

## DB-Strecken „ABS 46/2 Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen („Betuwe“-Linie“) und „Rhein-Ruhr-Express (RRX)“ - Aktuelle Sachstandsmitteilung


### Inhalt

<b>I. Betuwe-Verfahren .....</b>	<b>2</b>
1. Planfeststellungsbeschluss (PFB) erlassen .....	2
1.1 PFA 1.1 Oberhausen: PFB vom 24.09.2015 .....	2
1.2 PFA 1.3 Dinslaken: PFB vom 09.09.2019 .....	2
1.3 PFA 1.4 Voerde: PFB vom 25.11.2019 .....	2
1.4 PFA 3.1 Rees-Haldern: PFB vom 21.12.2018 .....	3
2. Abgabebericht beim Eisenbahn-Bundesamt .....	3
2.1 PFA 1.2 Oberhausen-Sterkrade: Bericht vom 15.07.2020 .....	3
2.2 PFA 2.1 Friedrichsfeld: Bericht vom 29.01.2020 .....	3
2.3 PFA 2.2 Wesel: Bericht vom 31.08.2020 .....	4
3. Laufende Verfahren .....	4
3.1 PFA 2.3 Hamminkeln-Mehrhoog .....	4
3.2 <b>Neuer Sachstand</b> → PFA 3.2 Rees .....	5
3.3 <b>Neuer Sachstand</b> → PFA 3.3 Emmerich-Praest .....	5
3.4 PFA 3.4 Emmerich .....	6
3.5 <b>Neuer Sachstand</b> → PFA 3.5 Emmerich-Elten .....	6
<b>II. RRX-Verfahren .....</b>	<b>7</b>
1. Planfeststellungsbeschluss (PFB)/Plangenehmigung erlassen .....	7
1.1 PFA 1.3 Leverkusen: PFB aus März 2019 .....	7
1.2 PFA 4 Mülheim an der Ruhr: Plangenehmigung vom 31.10.2013 .....	7
1.3 PFA 5a Essen: PFB vom 31.10.2018 .....	8
2. Abgabebericht beim Eisenbahn-Bundesamt .....	8
2.1 PFA 3.0 Düsseldorf (Wehrhahn/Unterrath): Bericht vom 25.10.2018 .....	8
2.2 PFA 3.0a Düsseldorf (Unterrath – Kalkum) (BR Münster zuständig) .....	9
2.3 <b>Neuer Sachstand</b> → PFA 2.1 Düsseldorf (Reisholz/Wehrhahn): Bericht vom 29.12.2020 .....	9
3. Laufende Verfahren .....	10
3.1 PFA 3.2 Düsseldorf Angermund – Duisburg Schlenk (BR Arnsberg zuständig) 10	
3.2 PFA 3.3 Duisburg HBF – Abzweig Kaiserberg .....	11
Ausblick: .....	11

# I. Betuwe-Verfahren

## 1. Planfeststellungsbeschluss (PFB) erlassen

### 1.1 PFA 1.1 Oberhausen: PFB vom 24.09.2015

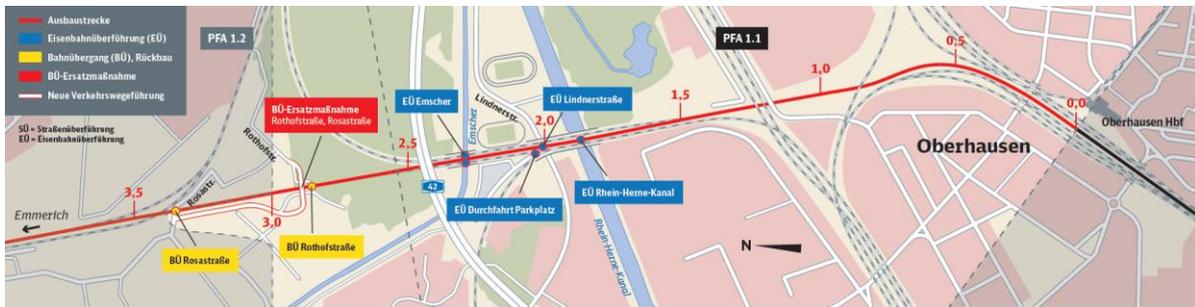


[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1\\_1.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1_1.pdf)

### 1.2 PFA 1.3 Dinslaken: PFB vom 09.09.2019



[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1\\_3.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1_3.pdf)

### 1.3 PFA 1.4 Voerde: PFB vom 25.11.2019

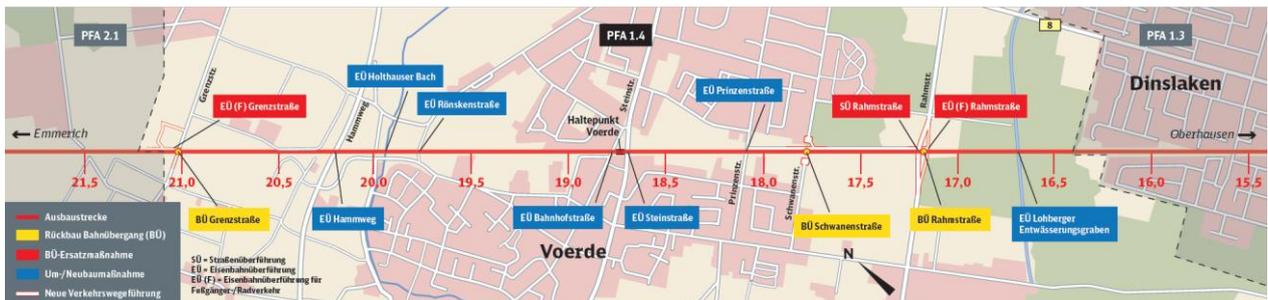

[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1\\_4.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1_4.pdf)

## 1.4 PFA 3.1 Rees-Haldern: PFB vom 21.12.2018



[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3\\_1.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3_1.pdf)

## 2. Abgabebericht beim Eisenbahn-Bundesamt

### 2.1 PFA 1.2 Oberhausen-Sterkrade: Bericht vom 15.07.2020




[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1\\_2.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-1_2.pdf)

### 2.2 PFA 2.1 Friedrichsfeld: Bericht vom 29.01.2020



[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2\\_1.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2_1.pdf)

## 2.3 PFA 2.2 Wesel: Bericht vom 31.08.2020

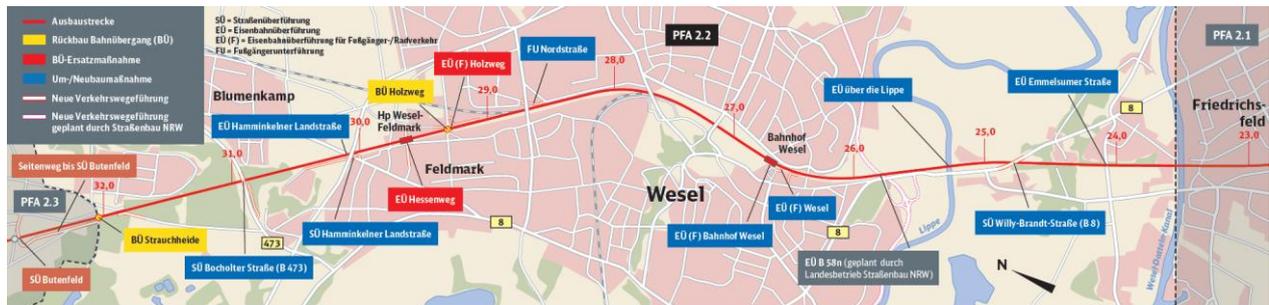

[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2\\_2.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2_2.pdf)

## 3. Laufende Verfahren

### 3.1 PFA 2.3 Hamminkeln-Mehrhoog




[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2\\_3.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-2_3.pdf)

Verfahrensablauf:

12.12.2012	Antragseingang BRD
13.04.2016 und 14.06.2016	EÖT
13.10.2017	Eingang 1. Deckblatt BRD
30.07.2019	Eingang Unterlagen des 1. und 2. Deckblatts BRD
7.10.bis 6.11.2019	Offenlage Deckblattunterlagen
21.11.2019	Ende der Einwendungsfrist
Ab Ende März 2020	Eingang Synopse und Synopsenlauf
Derzeit	Erstellung des Abgabeberichts

### 3.2 Neuer Sachstand → PFA 3.2 Rees

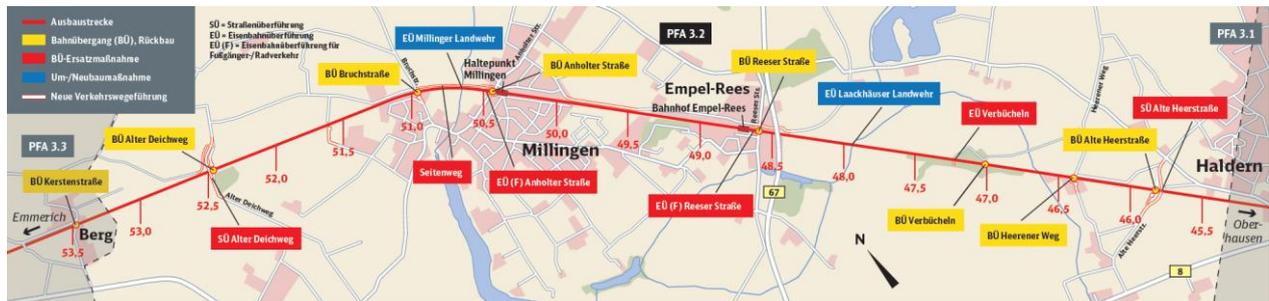

[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3\\_2.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3_2.pdf)

Verfahrensablauf:

12.06.2013	Antragseingang BRD
24.10.2016	EÖT
Ende 2019	Deckblatt angekündigt ( <b>Februar 2021</b> )

### 3.3 Neuer Sachstand → PFA 3.3 Emmerich-Praest




[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3\\_3.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3_3.pdf)

Verfahrensablauf:

18.12.2011	Antragseingang BRD
04.03.2015	EÖT
28.04.2016	Eingang 1. Deckblatt
18.03.2019	Abgabebericht Ausgangsverfahren und 1. Deckblatt
25.02.2019	Eingang 2. Deckblatt
02.06.2020-01.07.2020	Offenlage 2. Deckblatt
15.07.2020	Ende Einwendungsfrist
November 2020	Eingang Synopse bei der BR
<b>bis 15.12.2020</b>	<b>Synopsenlauf</b>
<b>Derzeit</b>	<b>Anhörungsbericht wird erstellt.</b>

### 3.4 PFA 3.4 Emmerich

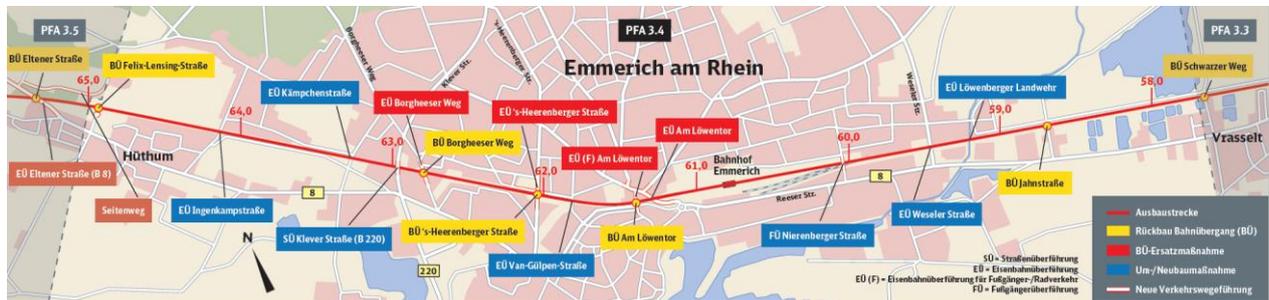

[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3\\_4.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3_4.pdf)

Verfahrensablauf:

12.02.2014	Antragseingang BRD
20.06.2017	EÖT
2020	Deckblatt angekündigt (Ende 1. Quartal 2021)

### 3.5 Neuer Sachstand → PFA 3.5 Emmerich-Elten



[https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3\\_5.pdf](https://www.emmerich-oberhausen.de/files/pdf/streckenkarten/Streckenkarte-PFA-3_5.pdf)

Verfahrensablauf:


10.03.2014	Antragseingang BRD
20.11.2018	EÖT
2020	Deckblatt angekündigt ( <b>April/Mai 2021</b> )

Wegen der Schließung einer EÜ ist die Verlegung der B 8 erforderlich. Das EBA hat entschieden, dass die beiden Planfeststellungsverfahren nicht zusammengefasst werden können.

## II. RRX-Verfahren

### 1. Planfeststellungsbeschluss (PFB)/Plangenehmigung erlassen

#### 1.1 PFA 1.3 Leverkusen: PFB aus März 2019

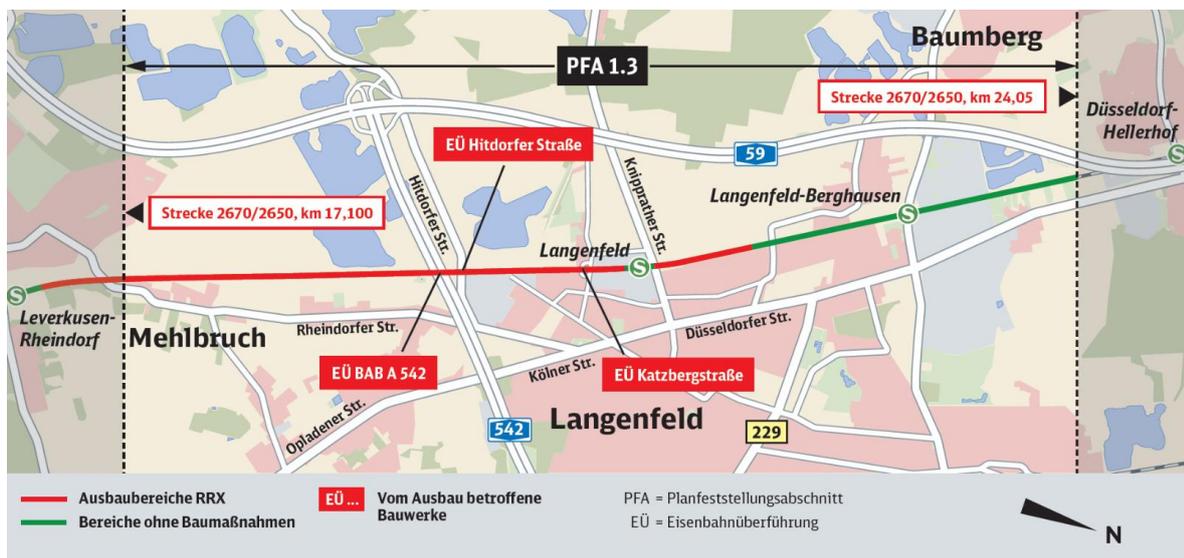

<https://www.rheinruhexpress.de/pfa1.3-langenfeld.html>

#### 1.2 PFA 4 Mülheim an der Ruhr: Plangenehmigung vom 31.10.2013



<https://www.rheinruhexpress.de/pfa4.0-muelheim.html>

### 1.3 PFA 5a Essen: PFB vom 31.10.2018



<https://www.rheinuhrexpress.de/pfa5a-essen.html>

## 2. Abgabebericht beim Eisenbahn-Bundesamt

### 2.1 PFA 3.0 Düsseldorf (Wehrhahn/Unterrath): Bericht vom 25.10.2018




<https://www.rheinuhrexpress.de/pfa3.0-duesseldorf.html>



### 3. Laufende Verfahren

#### 3.1 PFA 3.2 Düsseldorf Angermund – Duisburg Schlenk (BR Arnsberg zuständig)

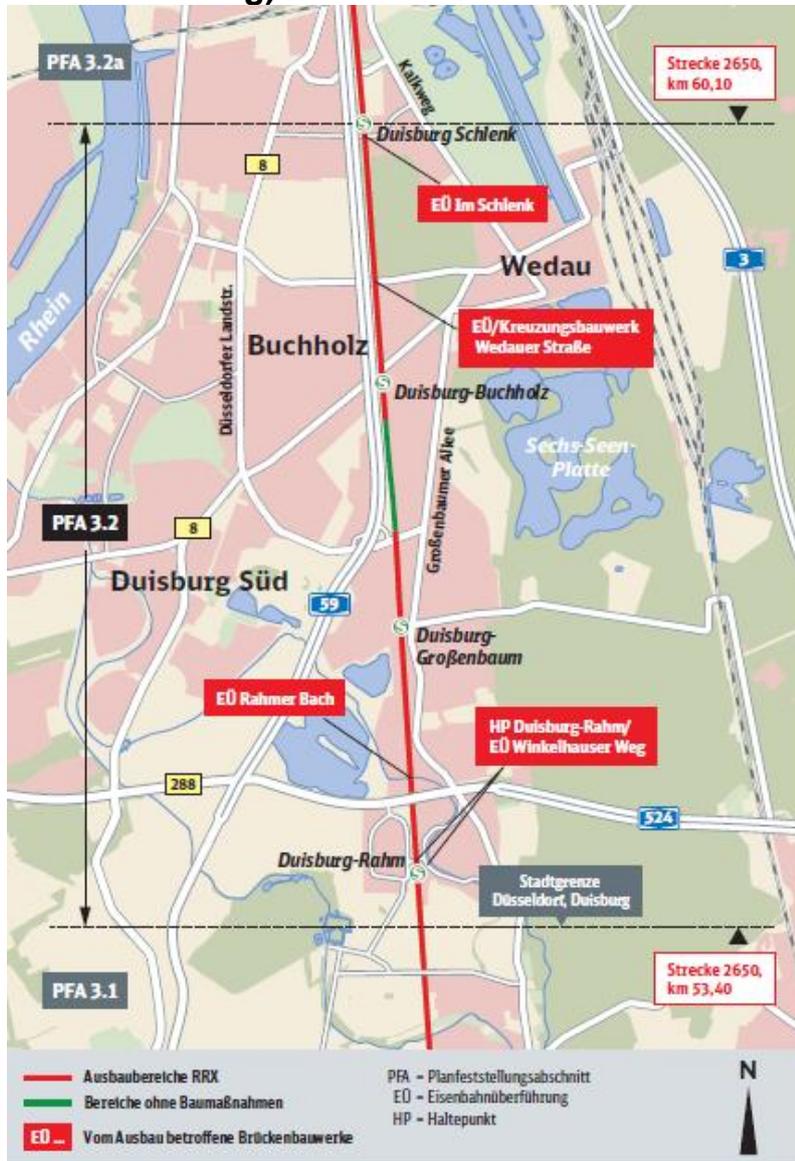

<https://www.rheinruhexpress.de/pfa3.2-duisburg.html>

Verfahrensablauf:

19.12.2018	Antragseingang beim EBA
29.04.2019	Antragseingang bei der BRD
16.09.2019 bis 15.10.2019	Offenlage der Antragsunterlage
29.10.2019	Ende der Einwendungsfrist.
02.03.2020	Erlass VM: Zuständigkeitsverlagerung zur BR Arnsberg
29./30.10.2020	Erörterungstermin

### 3.2 PFA 3.3 Duisburg HBF – Abzweig Kaiserberg



<https://www.rheinuhrexpress.de/pfa3.3-duisburg.html>

Verfahrensablauf:

22.06.2018	Antragseingang BRD
29.10. bis 28.11.2018	Offenlage
21.07.2020	Erörterungstermin
Derzeit	Anhörungsbericht wird erstellt

#### Ausblick:

Bezüglich der ausstehenden Abschnitte bleibt der Eingang der Unterlagen bei der BR Düsseldorf abzuwarten.

Das MBWSV hat seit Ende Februar 2014 im Rahmen der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit den betroffenen Bezirksregierungen und der DB für die beiden Verfahren zwei Internetseiten gestaltet, die über die aktuellen Sachstände informieren:

- <http://www.rrx.de/index.php?id=60>
- [http://www.mbwsv.nrw.de/verkehr/nahverkehr/Bus\\_Bahn/Planungsstand\\_Betuwe/index.php](http://www.mbwsv.nrw.de/verkehr/nahverkehr/Bus_Bahn/Planungsstand_Betuwe/index.php)
